



GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ATZITZINTLA PUEBLA A 15 DE ENERO DE 2021
OFICIO No. MAT/DEP-OBRAS-005/2021

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO
Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR.
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe del 4to. trimestre del ejercicio 2020**.

Anexo al presente en formato impreso, del módulo Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. JOSE JOAQUIN LOPEZ CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATZITZINTLA, PUEBLA



GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUEBLA.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

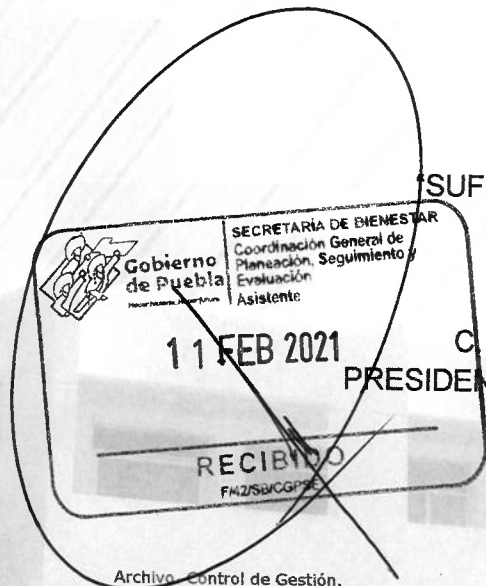

Archivo Control de Gestión.





MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
2018 - 2021

REPORTE 4TO TRIMESTRE 2020 DESTINO DEL GASTO FISDMF

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	4	PUE200401866130	Proyecto de inversión	1940467.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940467.42, modificado:1940467.42}}	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE CAPULIN DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 257663	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	257663	5	265
2020	4	PUE200401866233	Proyecto de inversión	2480386.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480386.63, modificado:2480386.63}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CARRETERA AL GTM Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 257859	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	257859	5	220
2020	4	PUE200401866020	Proyecto de inversión	566782.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566782.99, modificado:566782.99}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CAMPO DE BEISBOL DEL CADENAMIENTO 0+206 AL CADENAMIENTO 0+306 EN LA LOCALIDAD DE PASO CARRETAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 257381	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	257381	5	22
2020	4	PUE200401871499	Proyecto de inversión	1204813.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204813.24, modificado:1204813.24}}	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUE. - 269963	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	269963	5	330





MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
2018 - 2021
REPORTE 4TO TRIMESTRE 2020 DESTINO DEL GASTO FISDMF

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO	AVANCE_FINALIZADO
217	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 447.12, meta_modificada: 447.12}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 4, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PLAN DEL CAPULÍN, 75540 ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE CAPULIN UB, lon: -97.25122467, lat: 18.90277508}}	11-11-2020	31-12-2020	1940467.42	1940467.42	1940467.42	1940467.42	1152542.31	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MAT-IRS/011/2020, contratista: ROMERO BAZÁN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto: 1940467.42, importe_modificado: 1940467.42}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 447.12}}	{1866130/proyecto _INICIO, 1866130/proyecto _FIN, 1866130/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}, obs2: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}, obs3: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}, obs4: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}}			
180	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2106.08, meta_modificada: 2186.48}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 8, direccion: CALLE CONTINUACION PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, 75540 SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y MISMA C, lon: -97.28960081, lat: 18.94807713}}	20-11-2020	31-12-2020	2480386.63	2480386.63	2480386.63	2480386.63	1150973.51	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MAT-IRS/013/2020, contratista: EDGAR ALBERTO ADAN DIAZ, convocante: MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto: 2480386.63, importe_modificado: 2480386.63}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2186.48}}	{1866233/proyecto _INICIO, 1866233/proyecto _PROCESO, 1866233/proyecto _FIN, 1866233/proyecto _INICIO, 1866233/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}, obs2: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}, obs3: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}, obs4: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}}			
18	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 503.27, meta_modificada: 510.75}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 3, direccion: CALLE DEL CAMPO DE BEISBOL PUEBLO PASO CARRETAS, 75550 PASO CARRETAS, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA A ATZITZINTLA Y , CALLE TAMAUUPAS CALLE QUE LLEGA AL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD, lon: -97.25273672, lat: 18.9177977}}	06-11-2020	21-12-2020	566782.99	566782.99	566782.99	566782.99	170034.9	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MAT-IRS/009/2020, contratista: CONSTRUCTORA ZALIMA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto: 566782.99, importe_modificado: 566782.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 510.75}}	{1866020/proyecto _INICIO, 1866020/proyecto _FIN, 1866020/proyecto _PROCESO, 1866020/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}, obs2: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}, obs3: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}, obs4: {observación: Se regresa a petición del responsable, trimestre: 4.0, usuario: biancalramirezte, fecha: 2021-01-14}}			
270	0	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, meta: 120.0, meta_modificada: 120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 1, direccion: CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE Y , LOS CALENTADORES SOLARES SE COLOCARAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA ZONA AGE8, lon: -97.3263355, lat: 18.89969631}}	02-04-2020	31-05-2020	1204813.24	1204813.24	1204813.24	1204813.24	1204813.24	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: MAT-IRS/002/2020, contratista: CONSTRUCTORA DE OBRA ELECTRICA, TRUCTOBELÉC S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto: 2208824.27, importe_modificado: 2710829.78}}	{meta1: {unidad_medida: Celdas solares, avance: 120.0}}	{1871499/proyecto _PROCESO, 1871499/proyecto _FIN, 1871499/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación: ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DE LA OBRA CON FOLIO PUE200403671573, trimestre: 4.0, usuario: robertogarciaeu, fecha: 2021-01-12}}	Sin observaciones			





MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
2018 - 2021
REPORTE 4TO TRIMESTRE 2020 DESTINO DEL GASTO FISDMF

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMEN	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2020	4	PUE200401847455	Proyecto de inversión	1860000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860000.0, modificado:1860000.0}}	ADQUISICION DE DOS TRACTORES PARA EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA. - 229184	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	229184	5	1824
2020	4	PUE200401848572	Proyecto de inversión	1933442.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933442.23, modificado:1933442.23}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA BARRANCA ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE PASO CARRETAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 232619	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	232619	5	591
2020	4	PUE200401866068	Proyecto de inversión	2314416.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314416.56, modificado:2314416.56}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA CLINICA ENTRE CLINICA Y CAMPO Y PRIVADA REFORMA 1 ENTRE ADOQUINAMIENTO EXISTENTE Y CALLE DE LA CLINICA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XOCHILOMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 257536	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	257536	5	262
2020	4	PUE200401871101	Proyecto de inversión	135286.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135286.57, modificado:135286.57}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CARRETERA MAGUEYES Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE CAPULIN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 269180	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	269180	5	265





MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
2018 - 2021
REPORTE 4TO TRIMESTRE 2020 DESTINO DEL GASTO FISDMF

DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROY FECHA_INICIO	DETALLE_PROYE FECHA_TERMINO	AVANCE_FINAL RECAUDADO	AVANCE_FINAL COMPROMETIDO	AVANCE_FINAL DEVENGADO	AVANCE_FINAL EJERCIDO	AVANCE_FINAL PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISI AVANCES_FISI	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
1493		0 {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 10 DIEZ INTERIOR SN PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA, U, lon:-97.32758831, lat:18.89743646}}	28-11-2020	07-12-2020	1860000	1860000	1860000	1860000	1860000	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT- IR5/015/2020, contratista:COMERCIALIZAD ORA DE AGROMAQUINARIA DE PEROTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:1860000.0, importe_modificado:18600 00.0}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0)}	{1847455/proyecto _PROCESO, 1847455/proyecto _INICIO, 1847455/proyecto _FIN, 1847455/proyecto _PROCESO, 1847455/proyecto _INICIO, 1847455/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
483		0 {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.8, meta_modificada:1636.8 3)}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE DE LA BARRANCA PUEBLO PASO CARRETAS, 75550 PASO CARRETAS, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE DE LA BARRANCA Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE UBICADA AL PONIENTE DE LA TRAZA URBANA POR LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIA, lon:-97.25865904, lat:18.9209059}}	22-10-2020	22-12-2020	1933442.23	1933442.23	1933442.23	1933442.23	1933442.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT- IR5/008/2020, contratista:MAURO ZAMORA EVANGELISTA, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:1854227.79, importe_modificado:19334 42.23}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.8 3)}	{1848572/proyecto _PROCESO, 1848572/proyecto _FIN, 1848572/proyecto _INICIO, 1848572/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
215		0 {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.1, meta_modificada:1672.1 4)}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE DE LA CLINICA PUEBLO GUADALUPE XOCHILOMA, 75551 GUADALUPE XOCHILOMA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE DE LA CLINICA UBICADA EN TRE CAMPO DE FUTBOL Y CLINICA DE SALUD DE LA, lon:-97.35548838, lat:18.96727084}}	19-09-2020	02-12-2020	2314416.56	2314416.56	2314416.56	2314416.56	2314416.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT- IR5/007/2020, contratista:FERNANDO HEREDIA NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:1852099.09, importe_modificado:23144 16.56}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.1 4)}	{1866068/proyecto _FIN, 1866068/proyecto _PROCESO, 1866068/proyecto _INICIO, 1866068/proyecto _PROCESO, 1866068/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
217		0 {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.78, meta_modificada:113.78)}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO PLAN DEL CAPULÍN, 75540 PLAN DEL CAPULÍN, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA A TOLUCA, CALLE MIGUEL DE LA MADRID CALLE JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LA SALIDA HACIA LA LOC, lon:-97.25218222, lat:18.89937716}}	19-09-2020	08-10-2020	135286.57	135286.57	135286.57	135286.57	135286.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT- IR3/006/2020, contratista:MAURO ZAMORA EVANGELISTA, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:135286.57, importe_modificado:13528 6.57}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.78)}	{1871101/proyecto _INICIO, 1871101/proyecto _FIN, 1871101/proyecto _PROCESO, 1871101/proyecto _FIN, 1871101/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
2018 - 2021
REPORTE 4TO TRIMESTRE 2020 DESTINO DEL GASTO FISDMF

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROB	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMEN	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESP	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONS	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROY	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES
2020	4	PUE200401871391	Proyecto de inversión	626093.39	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626093.39, modificado:121813.81}}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 269752	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	269752	5	55
2020	4	PUE200401871573	Proyecto de inversión	1004011.03	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004011.03, modificado:1506016.54}}}	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUE. AGEB 005A - 270113	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	270113	5	275
2020	4	PUE200401877298	Acción	200732.61	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200732.61, modificado:222900.25}}}	ADQUISICION DE EQUIPO SOFTWARE Y HARDWARE PARA ATENDER LOS TRAMITES DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA PRODIMDF - 81152	21	Puebla	23	Atzitzintla	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	81152	N	0





**MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
2018 - 2021
REPORTE 4TO TRIMESTRE 2020 DESTINO DEL GASTO FISDMF**

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYE	AVANCE_FINA	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINANC	AVANCE_FIN	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN	RECAUDADO	COMPROMETID	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.05, meta_modificada:99.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EL DIF MUNICIPAL A UN COSTADO Y LLEGA A, lon:-97.3268145, lat:18.90085208}}	20-11-2020	31-12-2020	121813.81	121813.81	121813.81	121813.81	121813.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR3/014/2020, contratista:EDGAR ALBERTO ADAN DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:772962.1, importe_modificado:83288.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.83}}	{1871391/proyecto _INICIO, 1871391/proyecto _PROCESO, 1871391/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTA OBRA SE REALIZO EN COMBINACION DE RECURSOS FISDMF Y FORTAMUNDF (PUE200401877709), trimestre:4.0, usuario:robertogarciaeu, fecha:2021-01-12}}	Sin observaciones
225	0	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE Y , LOS CALENTADORES SOLARES SE COLOCARAN EN DIFERENTES VIVIENDAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES CALLES, lon:-97.32332761, lat:18.89890289}}	02-04-2020	31-05-2020	1506016.54	1506016.54	1506016.54	1506016.54	1506016.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR5/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRA ELECTRICA, TRUCTOBELEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:2208824.27, importe_modificado:2710829.78}}	{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:150.0}}	{1871573/proyecto _INICIO, 1871573/proyecto _FIN, 1871573/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DE LA OBRA CON FOLIO PUE200401871499, trimestre:4.0, usuario:robertogarciaeu, fecha:2021-01-12}}	Sin observaciones
0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.327388, lat:18.897382}}	24-07-2020	24-08-2020	222900.25	222900.25	222900.25	222900.25	222900.25	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-IR3/018/2020, contratista:SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:222900.25, importe_modificado:222900.25}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1877298/proyecto _INICIO, 1877298/proyecto _FIN, 1877298/proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
2018 - 2021
REPORTE 4TO TRIMESTRE 2020 DESTINO DEL GASTO FORTAMUNDF

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
	2020	4 PUE200401877730	Proyecto de inversión	558544.51	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558544.51, modificado:558544.51}}	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	20021	N	0	0	0	4678
	2020	4 PUE200401877734	Proyecto de inversión	2518044.07	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518044.07, modificado:2518044.07}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ATZITZINTLA, SANTA CRUZ CUYACHAPA, LOS CHÁVEZ, PASO CARRETAS, PLAN DE CARPULÍN, SAN ANTONIO EL ALTO, SAN JOSÉ DESPACHO EL ASERRADERO, SAN JUAN HUJOLFAPAN, SAN JUANERO, SAN MANUEL DE LA SIERRA, SANTA CRUZ TEXMAQUILLA, TOLUCA Y GUADALUPE XOCHILOMA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	21	Puebla	23	Atzitzintla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	20014	N	0	0	0	9344
	2020	4 PUE200401877709	Proyecto de inversión	711074.26	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711074.26, modificado:711074.26}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE PINO SUÁREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	21	Puebla	23	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	20008	N	0	0	0	100





MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
2018 - 2021

REPORTE 4TO TRIMESTRE 2020 INDICADORES FORTAMUNDF

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2020	4	4	Puebla	Atzitzintla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	154760	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos	$\frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}} * 100$	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado





MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
2018 - 2021
REPORTE 4TO TRIMESTRE 2020 INDICADORES FORTAMUNDF

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo	
2020	4	4	Puebla	Atzitzintla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i = número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de i} / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de i}) * 100$	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	100	Validado
2020	4	4	Puebla	Atzitzintla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	100	Validado





**MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
2018 - 2021
REPORTE 4TO TRIMESTRE 2020 INDICADORES FORTAMUNDF**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2020	4	4	Puebla	Atzitzintla	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151872	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	5.72471		5.72471		6.28408	91.1	Validado

